

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า การรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

ในระหว่าง 1 กันยายน 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร สผ.



คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ.


เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ณ บริเวณก่อสร้างอาคาร สผ.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

<https://www.onep.go.th/พิธีวางศิลาฤกษ์-ก่อสร้าง/>

การตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

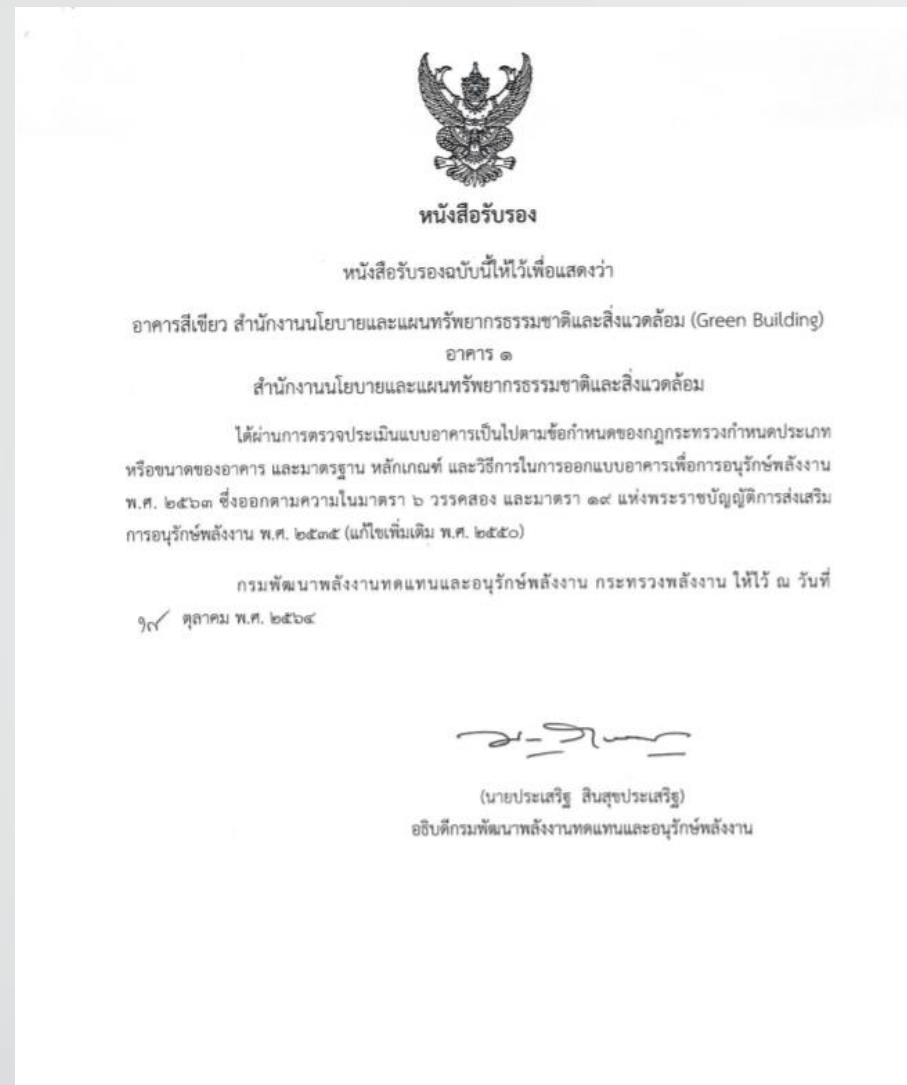


อาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Building) อาคาร 1 และ 2 มีการออกแบบของอาคารฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 และได้รับหนังสือรับรองและสรุปผลการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564


ลงพื้นที่และชี้แจงชุมชนเพื่อแจ้งการสิ้นสุดงานเสาเข็ม และการติดตั้ง Sheet Pile



เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สผ. บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง และบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่และชี้แจงชุมชนโดยรอบการก่อสร้างอาคาร สผ. เพื่อแจ้งการติดตั้งและผลกระทบจากการกด Sheet Pile โดยพบปะและพูดคุยกับหัวหน้าครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการยอมรับการทำงานที่ผ่านมาของบริษัทได้ดีพอสมควรและได้มีการฝากประเด็นผลกระทบ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเล็กน้อย อาทิ เรื่องแรงสั่นสะเทือน และเสียง จากงานเสาเข็มในระยะที่ผ่านมาเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบและจะนำไปปรับปรุงการทำงานในขั้นตอนต่อไป




ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.



เดือนมกราคม
2565

ภาพรวมโครงการ

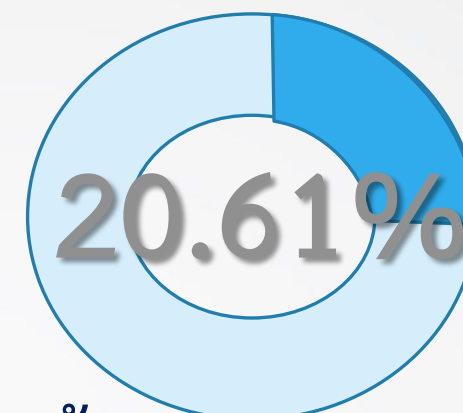

งานตอก Sheet Pile และงานขุดดินชั้นใต้ดิน อาคาร 2
จำนวน 230/312 เมตร 73.72%

งานเทคอนกรีตฐานราก
แล้วเสร็จ 9/22 ฐาน 40.91%

ปริมาณงานขุดดิน

สะสมที่แล้วเสร็จ 1,305/20,953.74 คิว คิดเป็น 6.29%


ปริมาณงานติดตั้ง Bracing
สะสมที่แล้วเสร็จ 118 เมตร



ระยะเวลาตามสัญญา 1 เมษายน 2564 – 19 มิถุนายน 2566





ลงพื้นที่และชี้แจงชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์การทำประตูชั่วคราว

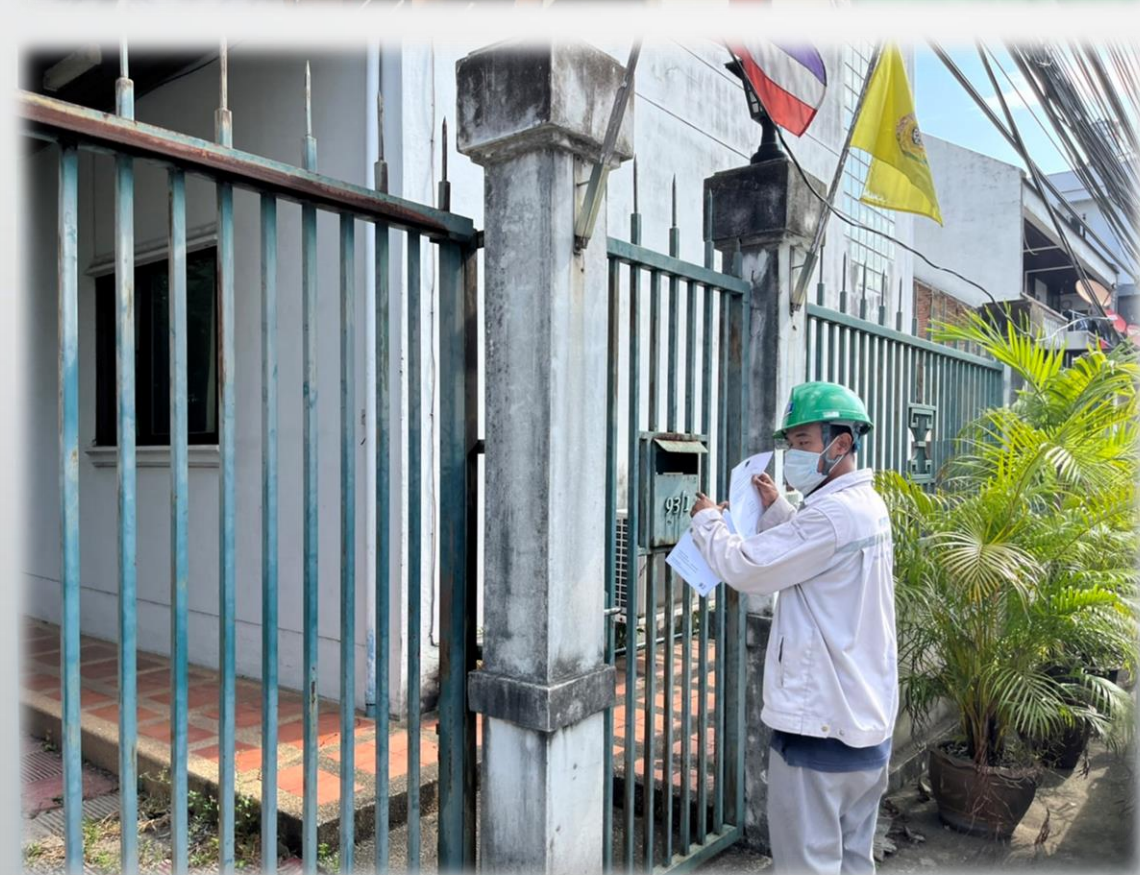

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สผ.
บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง และบริษัท
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่และชี้แจงชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์การทำประตูชั่วคราว
ในบริเวณเยื้องร้านอาหารบ้านนาย ให้แก่
บ้านข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบ

ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

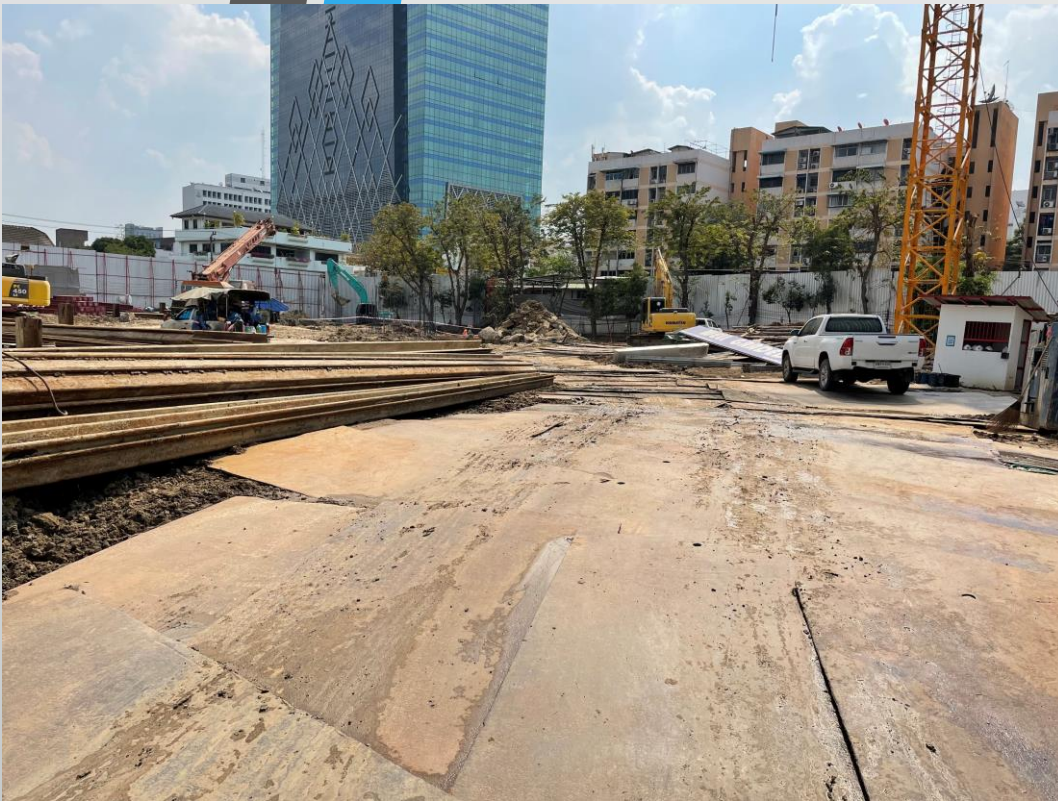

ภาพรวมโครงการ 37.40% ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ก่อสร้างมาแล้ว 303 วัน เป้าหมาย 810 วัน

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	0.115 mg/m ³	ไม่เกิน 0.33 mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	0.082 mg/m ³	ไม่เกิน 0.120 mg/m ³
ระดับเสียง (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	62.4 db(A)	ไม่เกิน 70 db(A)
ระดับเสียงสูงสุดใน 24 ชั่วโมง	97.4 db(A)	ไม่เกิน 115 db(A)
ระดับความสั่นสะเทือน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	0.127 db(A)	ไม่เกิน 5 db(A)
